

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程
施工 101 标段金吉路站
检测验收总结



上海同济检测技术有限公司

2026 年 4 月 20 日

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工 101 标段


金吉路站检测小结

一、工程概况及验收范围

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程是上海市市域快速轨道交通，崇明线南起浦东金桥地区金吉路站，终于崇明陈家庄裕安站，线路全长 42.955km，设站 8 座，地下站 7 座，高架站 1 座。

金吉路沿申江路南北向布置，本站位于申江路-东侧绿化带内，北过榕桥路，南临金海路。车站主体基坑设置两道封堵墙，分三个基坑施工，采用明挖顺作法施工。

本站为明挖地下二层岛式车站。车站主体规模 $425.27 \times 20.2\text{m}$ (内净)。与 9 号线金吉路站 4 号口通道换乘。共设有 2 个出入口，3 组风亭。

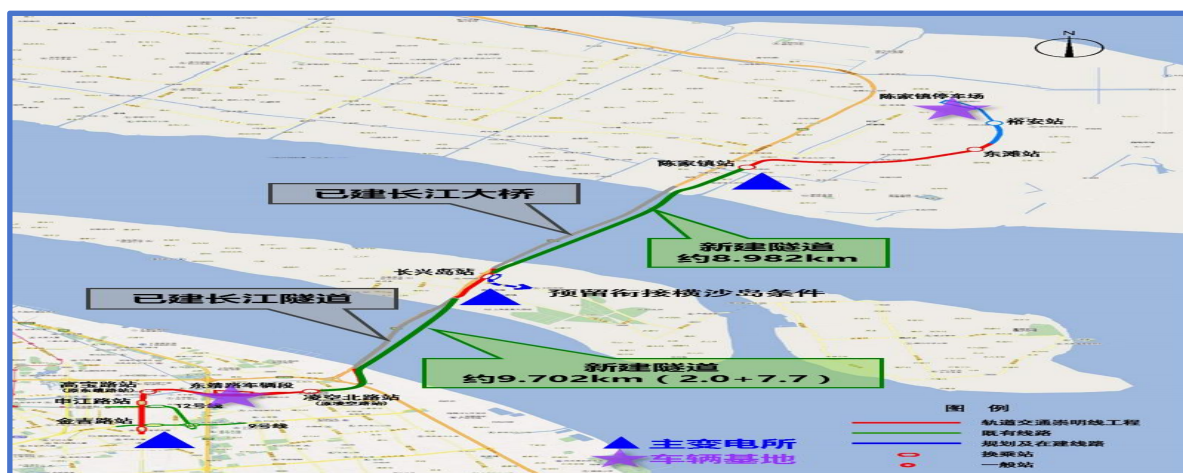

项目平面示意图

本次验收范围：金吉路站车站主体及 1 号风亭组；附属 1 号出入口；附属 2 号出入口及 2、3 号风亭组；换乘通道及改造。

二、检测内容

上海同济检测技术有限公司受上海申通地铁建设集团有限公司的委托，对该工程的原材料及功能实体进行检测。主要检测内容包括：结构材料、周转材料、防水材料、主体结构、地基基础等。在工程建设中，对工程材料和实体质量进行严格控制和规范管理，确保工程质量。

三、检测依据

《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）；《建设工程质量检测管理办法》住建部第 57 号令；市府第 73 号《上海市建设工程检测管理办法》；沪建安质监[2013] 78 号《关于进一步规范建设工程检测行业若干规定的通知》；沪地铁建司（2023）75 号《上海轨道交通建设工程材料和设备检测项目清单》等相关文件、检测规范标准、相关设计文件及合同文件要求等。

主要检测标准规范如下：

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009/2024

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023

《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2024

《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2024

《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T228.1-2021

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

《高分子防水材料 第 2 部分：止水带》GB/T18173.3-2014

《自粘性聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009

《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008

《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011

《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013

《遇水膨胀止水胶》 JG/T 312-2011

《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB 18445-2012

《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448-2015

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009

《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2023

《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收规程》 GB 50202-2018

《建筑地基与桩基检测技术规程》 DG/TJ08-218-2017

《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014

《建筑地基检测技术规范》 JGJ 340-2015

《混凝土中钢筋检测技术标准》 JGJT 152-2019

《结构混凝土抗压强度检测技术标准》 DG/TJ08-2020-2020

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

四、质量控制措施

我公司组建了以公司领导、技术负责人、项目负责人、各专业项目组组成的管理团队，管理网络清晰，责任到位。

在此项目中，见证取样是关键，也很重要。为保证试样能代表母体质量状况和取样的真实，防止出具只对试样（来样）负责的检测报告，保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性，以确保建设工程质量。根据建设部建【2000】211 号文《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定〉的通知》。我们采用由收样员持有效上岗证到工地现场收样，严格执行见证取样、送样制度。公司在收到委托单当天将样品及流转单及时流转至各检测室，涉及施工进度的样品加盖加急检测标识。样品进入检测室后，由各项目组负责人安排专人及时检测，如遇检测人员外出学习培训等特殊情况，调配其他持证人员完成检测任务。如遇法定假期，对加急样品安排检测人员加班检测。检测完成后，及时将数据上传协会软件，并及时出具检测报告。

为确保本工程的质量和安，彻底杜绝不合格材料在本工程上使用，我公司按要求执行对凡经本单位检测后确认为不合格或复检不合格的材料信息，都将在第一时间及时上报建设单位、监理等相关参建单位。

五、检测情况汇总

单位工程	检测项目	检测数量	检测结果
金吉路站	钢筋原材	315 组	合格
	钢筋焊接	291 组	合格
	钢筋机械连接	237 组	合格
	混凝土抗压	1563 组	合格
	混凝土抗渗	213 组	合格
	水泥原材	74 组	合格
	防水水泥涂料	2 组	合格
	橡胶防水材料	5 组	合格
	承插式盘扣脚手架	2 组	合格
	钢管	1 组	合格
	扣件	3 组	合格
	膨润土	3 组	合格
	聚合物水泥防水砂浆	1 组	合格
	聚氨酯防水涂料	2 组	合格
	水泥基渗透结晶防水涂料	2 组	合格
	止水带	3 组	合格
	遇水膨胀止水胶	3 组	合格
	PVC 防水板	2 组	合格
	水泥基灌浆料	1 组	合格
	环氧树脂灌浆料	1 组	合格
	混凝土界面剂	1 组	合格
	植筋胶	1 组	合格
	地墙墙身完整性检测	40 幅	合格
	钻孔桩成孔检测	315 根	合格
	钻孔桩桩身完整性检测	315 根	合格
	钻孔桩试桩检测	14 根	合格
	水泥土取芯抗压	85 根	合格
	树根桩桩身完整性检测	11 根	合格
	焊缝探伤检测	1 组	合格
	植筋检测	64 根	合格

	混凝土结构回弹检测	10 组	合格
	混凝土结构保护层检测	5 组	合格

六、不合格项

未出现不合格的情况。

七、总结

在整个项目实施过程中，作为第三方检测机构，我们积极配合现场建设各方的工作需求，按时、按要求进行收样、检测、出具检测报告，严格遵守见证取样的规定，做到公开、公平、公正。原材料检测方面，能及时指派专业检测人员到施工现场依据国家标准及有关规范的取样要求进行现场取样，并配备专用车辆，确保随叫随到，取样或收样后严格按检测工作程序规定内容及流程进行样品流转；保证样品在运输、接受、处置、保留等过程中的唯一性、完整性、无损性，并对样品进行检查、核对，记录检查，保证样品不被混淆。现场检测配备专业检测人员进驻现场，及时检测、第一时间反馈检测结果，有效保证工程质量、进度要求。整个检测工作开展过程中，本单位根据行业主管部门以及单位质量体系的要求规范、有序的开展检测工作，所有检测人员均持证上岗，检测设备均满足规范要求，检测标准均现行有效，所出具的检测报告均真实、可靠。

上海同济检测技术有限公司

2026 年 4 月 20 日
