

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程 施工 101 标段金吉路站～申江路站区间 检测验收总结



上海同济检测技术有限公司

2026 年 4 月 20 日

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工 101 标段

金吉路站～申江路站区间检测小结

一、工程概况及验收范围


金吉路站～申江路站区间工程线路由申江路站南端头井始发后，向南前行，沿途穿越巨峰路、陇桥路、秦桥路进入金吉路站北端头井接收，区间隧道位于申江路及其东侧绿化带下，隧道顶覆土埋深埋深 5.3～14.6m，最小曲线半径 1500m，最大纵坡 18%，隧道内径 6200mm，外径 6900mm。结构安全等级为一级，隧道防水等级为二级。

上行线:2024 年 9 月 2 日始发，2025 年 2 月 26 日接收

下行线:2024 年 7 月 15 日始发，2024 年 12 月 6 日接收

1#1 联络通道于 2025 年 5 月 19 日开挖，2025 年 6 月 22 日主体结构完成

2#1 联络通道于 2025 年 6 月 2 日开挖，2025 年 7 月 8 日主体结构完成

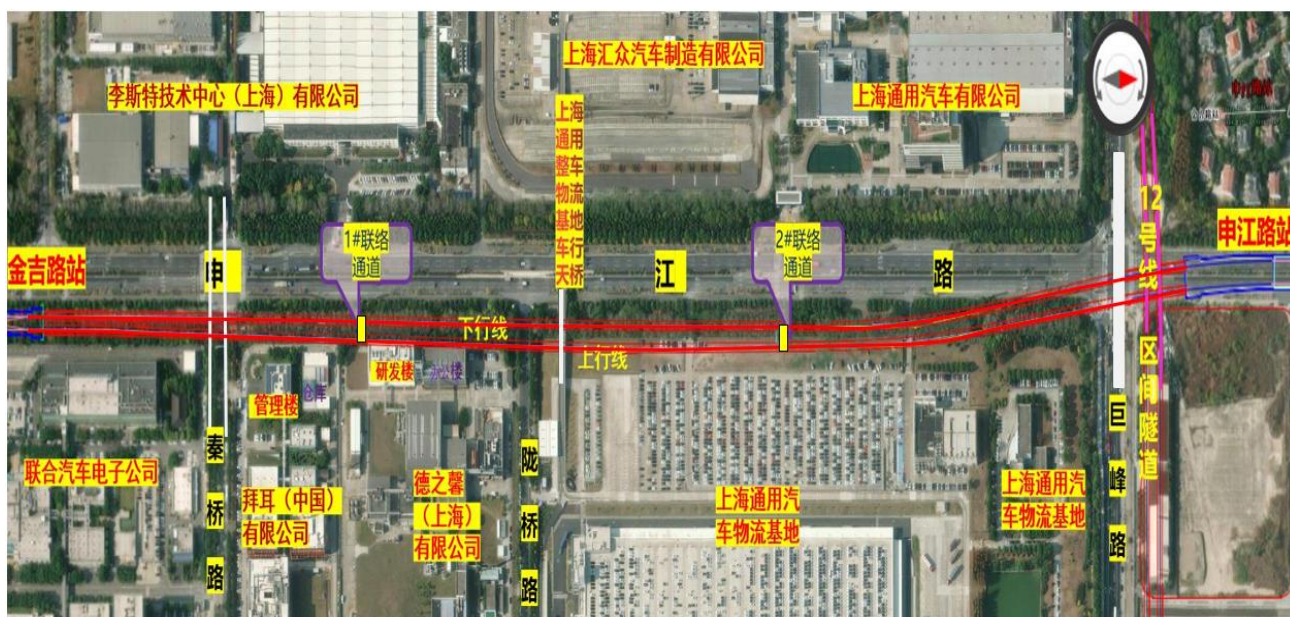

项目平面示意图

本次验收范围：金吉路站～申江路站区间隧道。

二、检测内容

上海同济检测技术有限公司受上海申通地铁建设集团有限公司的委托，对该

工程的原材料及功能实体进行检测。主要检测内容包括：结构材料、周转材料、防水材料、主体结构、地基基础等。在工程建设中，对工程材料和实体质量进行严格控制和规范管理，确保工程质量。

三、检测依据

《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）；《建设工程质量检测管理办法》住建部第 57 号令；市府第 73 号《上海市建设工程检测管理办法》；沪建安质监[2013] 78 号《关于进一步规范建设工程检测行业若干规定的通知》；沪地铁建司（2023）75 号《上海轨道交通建设工程材料和设备检测项目清单》等相关文件、检测规范标准、相关设计文件及合同文件要求等。

主要检测标准规范如下：

- 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019
- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009/2024
- 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2023
- 《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2024
- 《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2024
- 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》GB/T531.1-2008
- 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》GB/T528-2009
- 《盾构法隧道管片用软木橡胶衬垫》GB/T 31061-2014
- 《高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶》GB/T 18173.3-2014
- 《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下》GB/T 7759.1-2015
- 《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》GB/T 3512-2014
- 《高分子防水材料 第 1 部分片材》GB 18173.1-2012
- 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010
- 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011
- 《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013
- 《遇水膨胀止水胶》JG/T 312-2011
- 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448-2015

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJT 152-2019

四、质量控制措施

我公司组建了以公司领导、技术负责人、项目负责人、各专业项目组组成的管理团队，管理网络清晰，责任到位。

在此项目中，见证取样是关键，也很重要。为保证试样能代表母体质量状况和取样的真实，防止出具只对试样（来样）负责的检测报告，保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性，以确保建设工程质量。根据建设部建【2000】211号文《关于印发〈房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定〉的通知》。我们采用由收样员持有效上岗证到工地现场收样，严格执行见证取样、送样制度。公司在收到委托单当天将样品及流转单及时流转至各检测室，涉及施工进度的样品加盖加急检测标识。样品进入检测室后，由各项目组负责人安排专人及时检测，如遇检测人员外出学习培训等特殊情况下，调配其他持证人员完成检测任务。如遇法定假期，对加急样品安排检测人员加班检测。检测完成后，及时将数据上传协会软件，并及时出具检测报告。

为确保本工程的质量和安全生产，彻底杜绝不合格材料在本工程上使用，我公司按要求执行对凡经本单位检测后确认为不合格或复检不合格的材料信息，都将在第一时间及时上报建设单位、监理等相关参建单位。

五、检测情况汇总

单位工程	检测项目	检测数量	检测结果
	混凝土配合比验证	3 组	合格
	混凝土抗渗	1 组	合格
	混凝土同养	2 组	合格
	混凝土标养	4 组	合格
	钢筋原材	10 组	合格
	植筋拉拔	1 组	合格

金吉路站～ 申江路站区 间	螺栓、螺母	12 组	合格
	遇水膨胀橡胶	6 组	合格
	弹性橡胶密封垫	6 组	合格
	自粘性橡胶薄板	6 组	合格
	丁腈软木橡胶衬垫	1 组	合格
	单组份氯丁-酚醛粘结剂	6 组	合格
	遇水膨胀止水胶	1 组	合格
	塑料保护罩	1 组	合格
	界面处理剂	1 组	合格
	聚丙烯酸酯乳液防腐蚀水泥 砂浆	1 组	合格
	聚合物水泥防水砂浆	1 组	合格
	同步注浆试块抗压	1 组	合格
	水泥	15 组	合格
	水泥土取芯抗压 (三轴)	10 组	合格
	水泥土取芯抗压 (旋喷桩)	12 组	合格
	土工布	1 组	合格
	聚氨酯密封胶	1 组	合格
	ECB 防水板	1 组	合格
	硫铝酸盐微膨胀水泥	1 组	合格

六、不合格项

未出现不合格的情况。

七、总结

在整个项目实施过程中，作为第三方检测机构，我们积极配合现场建设各方的工作需求，按时、按要求进行收样、检测、出具检测报告，严格遵守见证取样的规定，做到公开、公平、公正。原材料检测方面，能及时指派专业检测人员到施工现场依据国家标准及有关规范的取样要求进行现场取样，并配备专用车辆，确保随叫随到，取样或收样后严格按检测工作程序规定内容及流程进行样品流转；保证样品在运输、接受、处置、保留等过程中的唯一性、完整性、无损性，并对

样品进行检查、核对，记录检查，保证样品不被混淆。现场检测配备专业检测人员进驻现场，及时检测、第一时间反馈检测结果，有效保证工程质量、进度要求。整个检测工作开展过程中，本单位根据行业主管部门以及单位质量体系的要求规范、有序的开展检测工作，所有检测人员均持证上岗，检测设备均满足规范要求，检测标准均现行有效，所出具的检测报告均真实、可靠。

上海同济检测技术有限公司

2026 年 4 月 20 日
